Review of Forestry Business Units – Draft Workplan

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
6					
7	Familiarisation	5 days	Mon 08/03/10	Fri 12/03/10	
8					
9	**Governance**	**60 days ?**	**Tue 09/03/10**	**Tue 01/06/10**	
10					
11	Devdop workplan	4 days?	Mon 15/03/10	Thu 18/03/10	
12					
13	**Criteria**	**11 days ?**	**Mon 15/03/10**	**Mon 29/03/10**	
14	- draft	2 days?	Mon 15/03/10	Tue 16/03/10	
15	- agree	1 day?	Thu 18/03/10	Thu 18/03/10	14
16	- DG review	1 day?	Fri 26/03/10	Fri 26/03/10	15
17	- finalise	1 day?	Mon 29/03/10	Mon 29/03/10	16
18					
19	**SG meetings**	**60 days**	**Tue 09/03/10**	**Tue 01/06/10**	
20	Kick-off	0 days	Tue 09/03/10	Tue 09/03/10	
21	First review	0 days	Thu 18/03/10	Thu 18/03/10	
22	Second review	0 days	Mon 19/04/10	Mon 19/04/10	
23	Report	0 days	Tue 01/06/10	Tue 01/06/10	
24					
25	**Fact-finding**	**35 days ?**	**Wed 10/03/10**	**Tue 27/04/10**	
26					
27	Desk research	10 days?	Wed 10/03/10	Tue 23/03/10	
28					
29	**Interviews**	**35 days ?**	**Wed 10/03/10**	**Tue 27/04/10**	
30	- Counties	10 days?	Thu 11/03/10	Wed 24/03/10	
31	- FBUs	12 days?	Wed 10/03/10	Thu 25/03/10	
32	- Other FC	11 days?	Tue 16/03/10	Tue 30/03/10	
33	- Trade unions	6 days?	Thu 25/03/10	Thu 01/04/10	
34	- External	13 days?	Tue 06/04/10	Thu 22/04/10	
35	- Supplementary	23 days?	Fri 26/03/10	Tue 27/04/10	
36					
37	**Analysis**	**28 days ?**	**Tue 06/04/10**	**Thu 13/05/10**	
38					
39	Assess status quo	7 days?	Tue 06/04/10	Wed 14/04/10	
40	Specify alternatives	6 days?	Fri 09/04/10	Fri 16/04/10	
41	Evaluate options	10 days?	Thu 22/04/10	Wed 05/05/10	40
42	Risk assessmnt	6 days?	Thu 06/05/10	Thu 13/05/10	41
43					
44	**Reporting**	**22 days ?**	**Thu 06/05/10**	**Fri 04/06/10**	
45					
46	Presentation	7 days?	Thu 06/05/10	Fri 14/05/10	
47	Initial draft	11 days?	Mon 17/05/10	Mon 31/05/10	46
48	Final report	3 days?	Wed 02/06/10	Fri 04/06/10	47
49					
50	**Communication**	**55 days ?**	**Wed 17/03/10**	**Tue 01/06/10**	
51					
52	Announcement	1 day?	Wed 17/03/10	Wed 17/03/10	
53	Update report	1 day?	Thu 22/04/10	Thu 22/04/10	
54	Completion	1 day?	Tue 01/06/10	Tue 01/06/10	

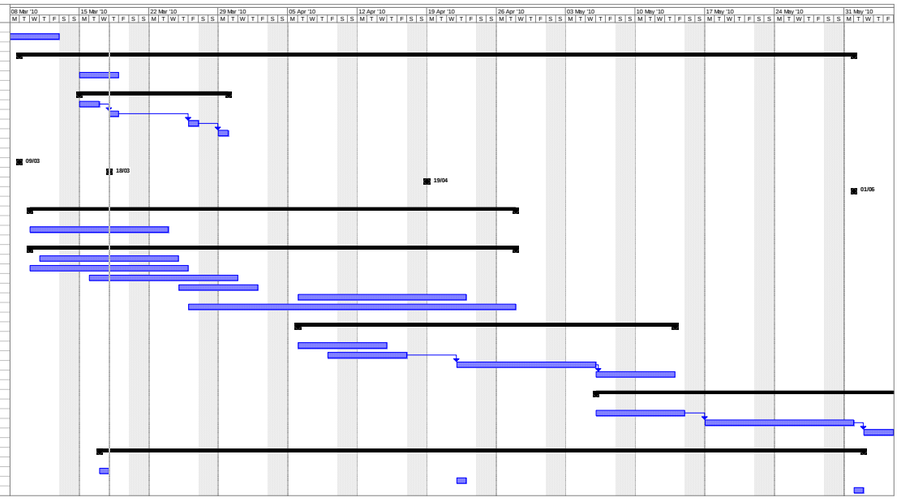

23rd March 2010
